



施工名稱：


高空工作車作業計畫書

		原事業單位確認欄*			施工公司確認欄				
		一般安全衛生 管理者	原事業單位安 全 衛生管理者	現場負責 人員	安全衛生責 任者	現場負責 人員			
會議日期	110 年 11 月 01 日 (一)	簽名	簽名	簽名	簽名	簽名			
施工公司名 稱	〇 〇 〇 公司	職稱 (安全衛生責任者)		道路引導標誌 牌安裝工作	完成日 110 年 11 月 1 日	完成者 〇〇〇			
作 業 內 容	作業內容	道路引導標誌牌安裝工作							
	作業地點	高雄科技大學第一校區				※每次人員配置、作業內 容、作業地點等發生變化 時制定。			
	作業日期 (作業期間)	110 年 11 月 02 日 ~ 110 年 11 月 03 日							
會 議 確 認 事 項	編號	①				②			
	高空工作車 車型/性能	工作台 積載荷重	200 kg	工作桶 限制人數	2 人	工作台 積載荷重	kg	工作桶 限制人數	人
		最大 離地高度	12 m	最大作業 半徑	5.1m	最大 離地高度	m	最大作業 半徑	m
		走行方式	☐ 車載式 ☐ 輪式 ☐ 履帶式		走行方式		☐ 車載式 ☐ 輪式 ☐ 履帶式		
		升降方式	☐ 伸臂式 ☒ 垂直升降式		升降方式		☐ 伸臂式 ☐ 垂直升降式		
		操作位置	☒ 工作台 ☐ 地面 ☐ 兼用		操作位置		☐ 工作台 ☐ 地面 ☐ 兼用		
		爬坡能力	度	※適用於履帶式及輪 式		爬坡能力	度	※適用於履帶式及輪式	
	地點	行政大樓正前方							
	預定作業時間	09 時 00 分 ~ 14 時 30 分							
	現 場 條 件	地形	☒ 平坦地 ☐ 傾斜地(度)				☐ 平坦地 ☐ 傾斜地(度)		
		機械停放 位置	☒ 柏油 ☐ 混凝土 ☐ 鋪設砂石 ☐ 鋪設鐵板 ☐ 碎石地 ☐ 其它()				☐ 柏油 ☐ 混凝土 ☐ 鋪設砂石 ☐ 鋪設鐵板 ☐ 碎石地 ☐ 其它()		
		接近架空配 電線路	☒ 無 ☐ 有(對策)				☐ 無 ☐ 有(對策)		
		作業範圍	作業半徑	3.5 m	最大作業高度	8 m	作業半徑	m	最大作業高度
	人 員 配 置	操作者姓名	X X X						
		作業指揮者 姓名	Y Y Y						
		溝通者姓名	Z Z Z						
	安 全 對 策	溝通方式	☒ 無線 ☐ 電話 ☐ 哨子 ☐ 手勢 ☐ 其它()						
		禁止進入 措施	☐ 路障 ☒ 三角錐 ☐ 連桿 ☐ 指派監視人員						
	作業方 法 (指導/ 說明)	原事業 單位 填寫	操作人員應於移動過程中，與監視人員保持 溝通，避免發生意外。 操作人員須於作業過程中，確實使用安全防 護具(含安全帽及安全帶)。						

參與及 確認者 簽名	(領班)	(作業關係者①) 通知日期： 通知日期： * 如果沒有空間可以簽名，請於右側空間簽名	(作業關係者②) 通知日期： 通知日期： * 如果沒有空間可以簽名，請於右側空間簽名
------------------	------	---	---

*原事業單位係指有實質管理能力或實際指揮監督之事業單位。

作業地點及作業方式 ※平面圖與剖面圖(可手寫)

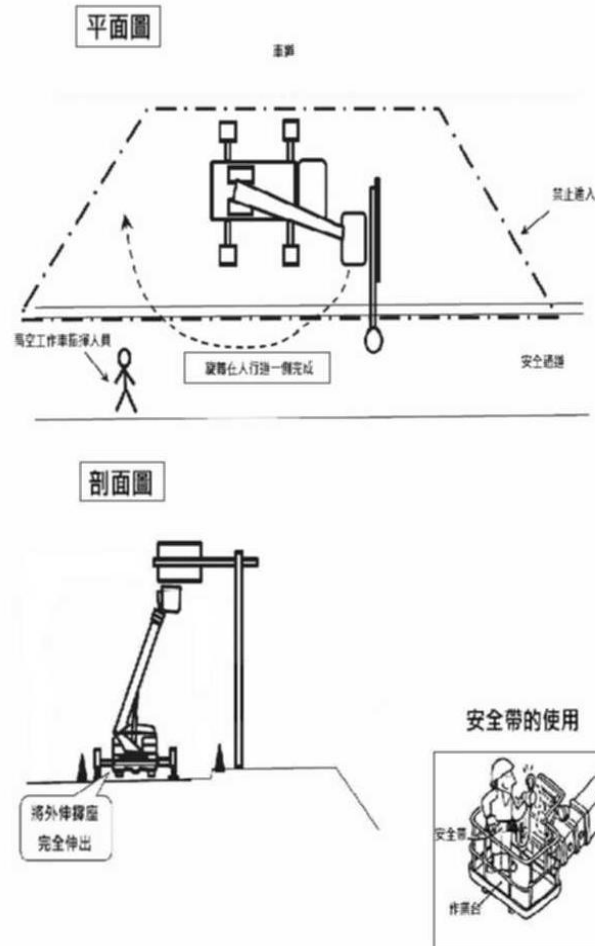

【遵守事項】

- 作業前應實施作業前檢點，並記錄於作業檢查表
- 應使用背負式安全帶及安全帽進行作業
- 離開駕駛座時，應將工作台下降至最低位置並關閉引擎，並採取預防高空工作車非預期移動之措施

【嚴格禁止】

- 禁止用於吊掛作業等主要用途以外之用途
- 禁止作業期間踩踏或跨越護欄等不安全行為。
- 禁止超過高空工作車之積載荷重及能力

【走行狀態下工作台的搭乘限制】

輪式伸臂型高空工作車

作業平台操作型—可以於作業平台升高的狀態下低速走行(僅限於平坦堅固的場所)
